

 شركة طرق الرياض للمقاولات RIYADH ROAD CONTRACTING CO.	 مكتب رمك للاستشارات الهندسية Office Ramak For Engineering Consultancy	 تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع info@ramakcompany.com 056637166 - 054471439																																										
المقاول	وكاله التعمير و المشاريع	الاستشاري																																										
شركة طرق الرياض للمقاولات	الاداره العامه للتنفيذ و الإشراف اداره تنفيذ الطرق	مكتب رمك للاستشارات الهندسية																																										
☒ تقديم جديد	مشروع تلال الغروب																																											
☐ اعادة تقديم	استمارة طلب تسليم رقم	الاعمال المساحيه و الترابيه																																										
اسم الحي: الأمير فواز رقم المخطط: BLOCK11 رقم الشارع: ROAD 01 عرض الشارع: ٢٢,٣ من محطة رقم: ١١٢,٥+٠ الى محطة رقم: ٢١٤+٠ تسلط الطبقة: TOP SUBGRADE اعمال اخرى: ☐ التاريخ: / / توقيع مدير المشروع: 																																												
المراقب ☐	المساح ☐	المختبر (١٣٩٠٠٣) ☒																																										
ملاحظات: ملاحظات:																																												
نتيجة تدقيق المساحة: من المحطة: الى المحطة: من المحطة: الى المحطة: مرفقات: ☐ القطاع الطولي ☐ القطاع العرضي ☐ اخرى متطابق ☒ غير متطابق ☐ التاريخ: / / التوقيع: 																																												
من محطة: الى محطة: توقيع المساح: التاريخ: / /																																												
نتيجة تدقيق المواد: تصنيف المواد: ☐ مرفق ☐ غير مرفق قيمه البركتور: الرطوبة المثلي: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">رقم الاختبار</th> <th colspan="2">رقم المحطة</th> <th rowspan="2">نوعية المواد</th> <th rowspan="2">نسبة الماء</th> <th rowspan="2">نسبة الرطوبة</th> <th rowspan="2">النتيجة</th> <th rowspan="2">ملاحظات</th> </tr> <tr> <th>من محطة</th> <th>الى محطة</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> النتيجة: ☐ ناجح ☐ راسب التوقيع: التاريخ: / /			رقم الاختبار	رقم المحطة		نوعية المواد	نسبة الماء	نسبة الرطوبة	النتيجة	ملاحظات	من محطة	الى محطة																																
رقم الاختبار	رقم المحطة			نوعية المواد	نسبة الماء						نسبة الرطوبة	النتيجة	ملاحظات																															
	من محطة	الى محطة																																										
ملاحظات: تعليمات المهندس الاستشاري: ☒ موافق ☐ غير موافق التوقيع:  تم الاستلام: منسوب المقاول: التاريخ: / /																																												

الإستشاري :- مكتب رومك للإستشارات الهندسية			الإدارة العامة للتخطيط والإسكان			المعاول :- شركة طرق الرياض للمعاولات			
رقم الشارع :-						تقسيم إستلام طبقه ردم			
ROAD-BH-1			علا الفروب						
214 M			BLOCK11						
22.200			TOP SUB-GRADE						
LAYAER THICKNESS									
DEOTH FROM TOP SUB.G									
PVI	Station	SLOPE	L		C.L	R		CL width from L	CL width from R
			1.15%	1.00%	0.00%	1.00%	1.15%		
			2.600	5.500	0.000	3.000	5.500	2.600	
10	112.5	528864.102	2370299.425	51.153	51.123	51.073	51.073	51.123	51.153
11	125	528875.6408	2370294.618	51.025	50.995	50.945	50.945	50.995	51.025
12	137.5	528887.1796	2370289.811	50.896	50.866	50.816	50.816	50.866	50.896
13	150	528898.7184	2370285.004	50.647	50.617	50.567	50.567	50.617	50.647
14	162.5	528910.2572	2370280.197	50.386	50.356	50.306	50.306	50.356	50.386
15	175	528921.796	2370275.391	50.208	50.178	50.128	50.128	50.178	50.208
16	187.5	528933.3348	2370270.584	50.137	50.107	50.057	50.057	50.107	50.137
17	200	528944.8737	2370265.777	50.018	49.988	49.938	49.938	49.988	50.018
18	212.5	528956.4125	2370260.97	49.877	49.847	49.797	49.797	49.847	49.877
19	214	528957.7966	2370260.394	49.860	49.830	49.780	49.780	49.830	49.860
الإستشاري									
مكتب رومك للإستشارات الهندسية									

In-place Density and Water Content of Soil by EDG

Project	تنفيذ اعمال البنية التحتية	Report No.	PRO-240463.32
Client	شركة طرق الرياض للمقاولات	Testing Date	03/06/2024
Location	جدة - حي الامير فواز - مخطط تلال الغروب	Sample By	Abdullah
Test Apparatus	NL scientific	Ref.	ASTM D 7698

Layer	Top Sub Grade
Location	Block 11 STA 0+100 to STA 0+214

FIELD TEST RESULTS						
TEST NO.	LOCATION	wet denisty	dry denisty	water content	compaction	percent req.
		kg/m3	kg/m3	%	%	%
1	0+120	2.347	2.182	7.5	99.6	
2	0+140	2.361	2.192	7.7	100.1	
3	0+170	2.333	2.170	7.5	99.1	
4	0+200	2.289	2.134	7.3	97.4	

M.D.D = 2.191 kg/m3
O.M.C = 7.52 %

The lab is responsible of all information provided in this report, unless this information is given by the client.

* These results are for the tested materials and tested locations only.

The lab is not responsible of sampling, sample is tested as received.

The report will not be re issued until authorized by the lab management, Lab is not responsible after two weeks of the test reoport date.

Checked by

[Signature]




Approved by

[Signature]



BLOCK 11

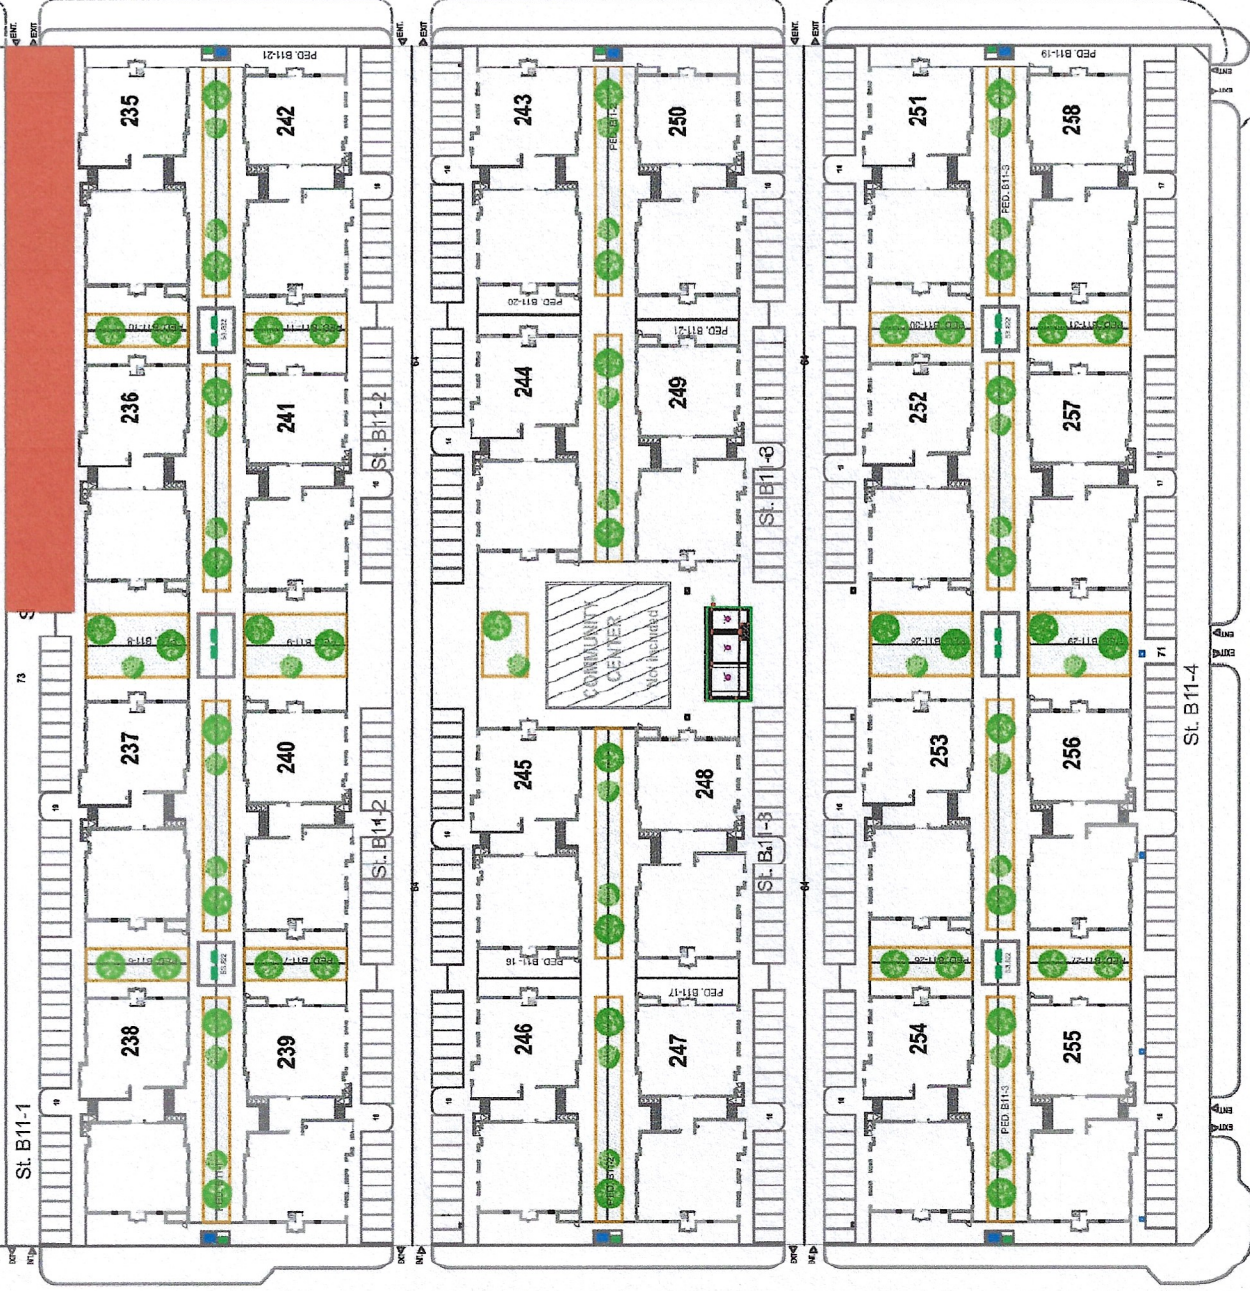

شارع عرض ٢٧,٠٠ متر

المملكة العربية السعودية
إمارة جدة
الإدارة العامة للأشراك والتقليد



المطور / شركة ساني الحامرية



شركة
ساني الحامرية
SANY Alameriah Co.

الاستشاري العام / الأبنية للاستشارات الهندسية



الأبنية للاستشارات الهندسية
Abnia Consulting Engineers
هندسة - عمارة - تخطيط
Architects - Planners - Engineers

الاستشاري / مكتب ريك للاستشارات الهندسية



مكتب ريك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط عمارة - إدارة مشاريع

المقاول / شركة طرق الرياض للمقاولات



شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROADS CONTRACTING CO.

المفاتح

الرمز	الرقم	المعالم	الشرح

P.N: ١

PLAN
